



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ โทร. ๐ ๕๖๙๙ ๐๓๕๔

ที่ พจ ๐๐๓๒.๐๐๓/ ๑๑๕๗/๖

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑


เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตให้นำผลวิเคราะห์ดังกล่าวไปเผยแพร่ต่อสาธารณชน ผ่านเว็บไซต์และปิดประกาศบนบอร์ดประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

  
(นายชรินทร์ ธรรมชิตกุล)  
หัวหน้างานพัสดุ สสจ.พิจิตร

  
(นายสุทิน ไทยภัทรพงศ์)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

- ทราบ  
- อนุญาต  
  
(นายณรงค์ ตั้งตรงไพโรจน์)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร




## วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร มีแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน จำนวนทั้งสิ้น 26 โครงการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 22,954,000 บาท ผลการดำเนินการ

### 1.ขั้นตอนการจัดหา

| ที่ | รายการ       | จำนวนโครงการ | วงเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท) | การดำเนินการจัดหา |                         |                     |                  |
|-----|--------------|--------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|------------------|
|     |              |              |                             | วิธีการจัดหา      | วงเงินที่จัดหาได้ (บาท) | เงินเหลือจ่าย (บาท) | ประหยัดได้ร้อยละ |
| 1   | ครุภัณฑ์     | 42           | 10,954,000                  | e-bidding         | 10,274,500              | 679,500             | 6.20             |
| 2   | สิ่งก่อสร้าง | 1            | 12,000,000                  | e-bidding         | 9,280,000               | 2,720,000           | 12.67            |
|     | รวม          | 43           | 22,954,000                  |                   | 19,554,500              | 3,399,500           | 14.81            |

ตารางแสดงร้อยละงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

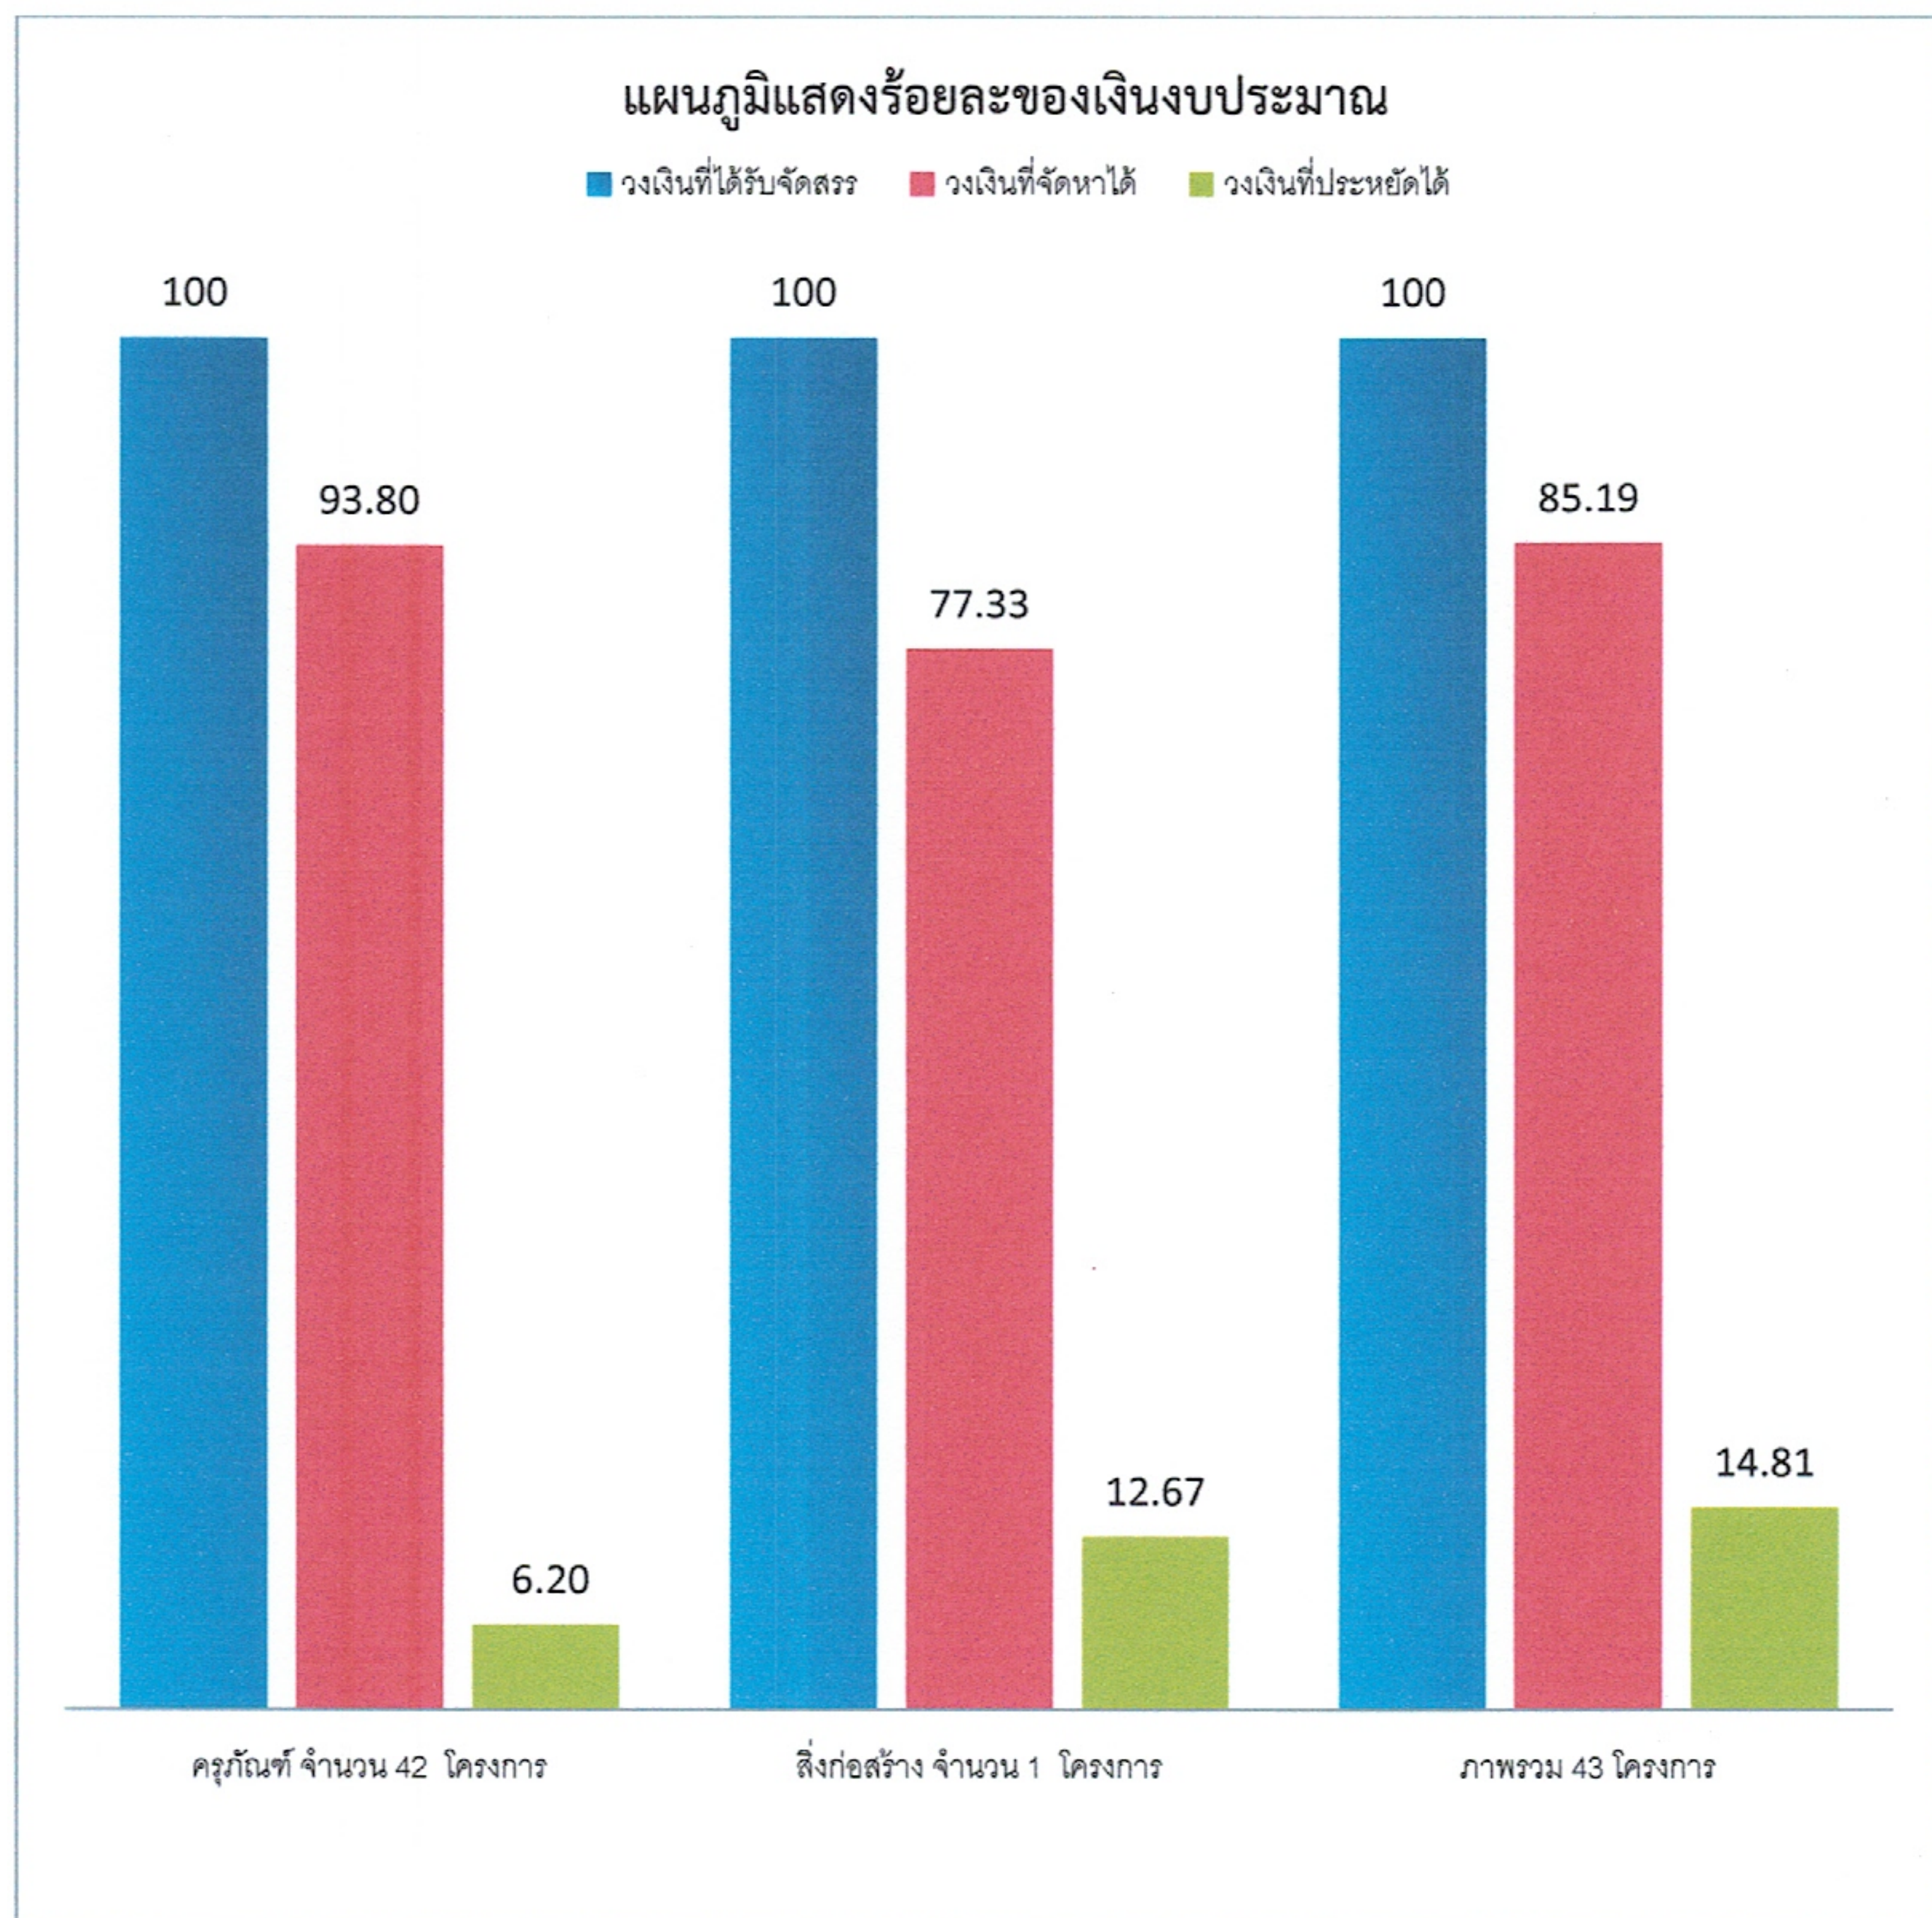



ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ทุกโครงการ โดยสามารถก่อกำหนดผู้ผูกพันได้ครบทุกโครงการ1 ดังนี้

-ครุภัณฑ์ ได้ 42 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100

-สิ่งก่อสร้าง ได้ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100

การประเมินผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า ผู้รับบริการ ผู้ค้า ผู้ขาย ผู้รับจ้าง หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการในปีงบประมาณ 2561 มีความพึงพอใจ โดยวัดจากไม่มีข้อทักท้วงหรือร้องเรียนแต่ประการใด สำหรับด้านความโปร่งใสเป็นธรรม ตรวจสอบได้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการเผยแพร่ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลางการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อสาธารณชนรวมทั้งปิดประกาศไว้ที่หน่วยงาน ทุกขั้นตอน และไม่มีปัญหาอุปสรรคใด ๆ

## 2.ขั้นตอนการเบิกจ่าย

| ที่ | รายการ       | จำนวนโครงการ | ก่อกำหนด(บาท) | เบิกจ่าย(บาท) | คงเหลือ (บาท) | ร้อยละของการเบิกจ่าย |
|-----|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| 1   | ครุภัณฑ์     | 42           | 10,274.500    | 10,274,500    | -             | 100                  |
| 2   | สิ่งก่อสร้าง | 1            | 9,280,000     | 3,248,000     | 6,032,000     | 35                   |
|     | รวม          | 43           | 19,554,500    | 13,522,500    | 6,032,000     | 69.15                |

ผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2561 ดังนี้

- ครุภัณฑ์ เบิกจ่ายได้ 42 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100

- สิ่งก่อสร้าง เบิกจ่ายได้ในปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน 3,248,000

บาท คิดเป็นร้อยละ 35 ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน 6,032,000 คิดเป็นร้อยละ 65

## ปัญหาอุปสรรค

ปัจจัยที่ทำให้การเบิกจ่ายค่าก่อสร้างล่าช้า ไม่สามารถเบิกจ่ายทั้งหมดในปีงบประมาณ 2561 เนื่องจากระยะเวลาการก่อสร้างที่กำหนดไว้ในงวดงานกำหนดในแต่ละโครงการ มีเวลาการก่อสร้างอย่าง 300 วัน เมื่อทำสัญญาแล้ววันสิ้นสุดสัญญาจะข้ามไปปีงบประมาณถัดไปทุกโครงการ



## การนำผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาใช้ในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จากการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค ทั้งในขั้นตอนการจัดหา และขั้นตอนการเบิกจ่าย นำมาสู่การวางแผนจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขั้นตอนการจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างไม่มีปัญหาอุปสรรคใด ๆ สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันเวลาทุกโครงการ และขั้นตอนการเบิกจ่าย ครุภัณฑ์สามารถเบิกจ่ายได้ครบทุกโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำหรับสิ่งก่อสร้างกันเงินไว้เบิกเหลือในปี เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ เช่นระยะเวลาการก่อสร้างที่กำหนดไว้ในวงงานกำหนดในแต่ละโครงการ มีเวลาการก่อสร้างที่ใช้เวลานาน ซึ่งต้องเป็นไปตามวงงานที่กองแบบแผนกำหนด การแก้ไขสัญญาที่ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร อย่างไรก็ตามเพื่อให้ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในปีงบประมาณ 2561 จึงได้กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค เกี่ยวกับงานก่อสร้างดังนี้

- 1.จัดเตรียมความพร้อม สถานที่ก่อสร้าง แบบแปลน บัญชีประมาณราคาก่อสร้างในรายการที่จัดทำของงบประมาณไว้ในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณพ.ศ.2561 เพื่อใช้จัดทำราคากลางท้องถิ่นได้ทันทีเมื่อได้รับจัดสรร

- 2.จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

- 3.กำหนดให้ผู้รับจ้างจัดทำแผนการก่อสร้างให้เป็นไปตามวงงานแห่งสัญญา



## ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2561

| ลำดับ | รายการ                                                                                                                        | วงเงินจัดสรร  | การบริหารสัญญา          |                        |             |          |                    |                              | การส่งมอบและเบิกจ่าย       |                                    |                      |                                                                                                                |  | ปัญหาอุปสรรค |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|------------------------|-------------|----------|--------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|
|       |                                                                                                                               |               | วงเงินตามสัญญา<br>(บาท) | เงินเหลือจ่าย<br>(บาท) | สัญญาเลขที่ | ลงวันที่ | ครบกำหนด<br>ส่งมอบ | การบอกเรียก<br>ค่าปรับ (วตป) | การส่งมอบ/<br>ตรวจรับ(วตป) | การส่งงานสิทธิ<br>ปรับ(ถ้ามี)(วตป) | การเบิกจ่าย<br>(วตป) |                                                                                                                |  |              |
| 1     | ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร<br>อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 1 ระบบ                                          | 12,000,000.00 | 9,280,000.00            | 2,720,000.00           | 108/2561    | 20 กพ 61 | 12 ธค 61           | 1 ธค 61                      |                            |                                    |                      | แบ่ง 6 งวด ส่งมอบใน<br>ปีงบประมาณ 61 จำนวน<br>2 งวด/ กันไว้เบิกเหลือ<br>ปี 4 งวด การก่อสร้าง<br>เป็นไปตามสัญญา |  |              |
| 2     | เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล โรงพยาบาลทับคล้อ ตำบล<br>เขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 30 เครื่อง                            | 75,000.00     | 38,700.00               | 36,300.00              | 25/2561     | 17 พย 60 | 16 มค 61           | 31 ธค 60                     | 29 ธค 60                   |                                    | 29 ธค 60             |                                                                                                                |  |              |
| 3     | เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล โรงพยาบาลสมเด็จพระ<br>ยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน<br>จังหวัดพิจิตร 30 เครื่อง       | 75,000.00     | 38,700.00               | 36,300.00              | 25/2561     | 17 พย 60 | 16 มค 61           | 31 ธค 60                     | 29 ธค 60                   |                                    | 29 ธค 60             |                                                                                                                |  |              |
| 4     | เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล โรงพยาบาลบางมูลนาก<br>ตำบลบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 30<br>เครื่อง                    | 75,000.00     | 38,700.00               | 36,300.00              | 25/2561     | 17 พย 60 | 16 มค 61           | 31 ธค 60                     | 29 ธค 60                   |                                    | 29 ธค 60             |                                                                                                                |  |              |
| 5     | เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล โรงพยาบาลวชิรบำรุงมี<br>ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบำรุง จังหวัดพิจิตร 30 เครื่อง                        | 75,000.00     | 38,700.00               | 36,300.00              | 25/2561     | 17 พย 60 | 16 มค 61           | 31 ธค 60                     | 29 ธค 60                   |                                    | 29 ธค 60             |                                                                                                                |  |              |
| 6     | เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล โรงพยาบาลบึงนาราง<br>ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 30 เครื่อง                          | 75,000.00     | 38,700.00               | 36,300.00              | 25/2561     | 17 พย 60 | 16 มค 61           | 31 ธค 60                     | 29 ธค 60                   |                                    | 29 ธค 60             |                                                                                                                |  |              |
| 7     | เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล โรงพยาบาลโพทะเล ตำบล<br>โพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 30 เครื่อง                               | 75,000.00     | 38,700.00               | 36,300.00              | 25/2561     | 17 พย 60 | 16 มค 61           | 31 ธค 60                     | 29 ธค 60                   |                                    | 29 ธค 60             |                                                                                                                |  |              |
| 8     | เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง<br>ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัด<br>พิจิตร 30 เครื่อง | 75,000.00     | 38,700.00               | 36,300.00              | 25/2561     | 17 พย 60 | 16 มค 61           | 31 ธค 60                     | 29 ธค 60                   |                                    | 29 ธค 60             |                                                                                                                |  |              |
| 9     | เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล โรงพยาบาลวังทรายพูน<br>ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 30<br>เครื่อง                 | 75,000.00     | 38,700.00               | 36,300.00              | 25/2561     | 17 พย 60 | 16 มค 61           | 31 ธค 60                     | 29 ธค 60                   |                                    | 29 ธค 60             |                                                                                                                |  |              |



| ลำดับ | รายการ                                                                                                                                                                  | วงเงินจัดสรร | การบริหารสัญญา          |                        |             |          |                    |                              | การส่งมอบและเบิกจ่าย       |                                    |                      |  |  | ปัญหาอุปสรรค |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------|-------------|----------|--------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------|--|--|--------------|
|       |                                                                                                                                                                         |              | วงเงินตามสัญญา<br>(บาท) | เงินเหลือจ่าย<br>(บาท) | สัญญาเลขที่ | ลงวันที่ | ครบกำหนด<br>ส่งมอบ | การบอกเรียก<br>ค่าปรับ (วตป) | การส่งมอบ/<br>ตรวจรับ(วตป) | การส่งวนสิทธิ์<br>ปรับ(ถ้ามี)(วตป) | การเบิกจ่าย<br>(วตป) |  |  |              |
| 10    | เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ(AED) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหลุม ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง                                         | 130,000.00   | 84,800.00               | 45,200.00              | 16/2561     | 17 พย 60 | 16 มค 61           | 31 ธค 60                     | 15 มค 61                   |                                    | 15 มค 61             |  |  |              |
| 11    | เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหลุม ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง                                                  | 86,000.00    | 85,000.00               | 1,000.00               | 19/2561     | 17 พย 60 | 16 มค 61           | 31 ธค 60                     | 27 ธค 60                   |                                    | 27 ธค 60             |  |  |              |
| 12    | เครื่องตั้งคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหลุม ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง                                | 375,000.00   | 373,000.00              | 2,000.00               | 22/2561     | 17 พย 60 | 16 มค 61           | 31 ธค 60                     | 27 ธค 60                   |                                    | 27 ธค 60             |  |  |              |
| 13    | เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบThermalไม่น้อยกว่าA4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหลุม ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง | 120,000.00   | 119,000.00              | 1,000.00               | 14/2561     | 17 พย 60 | 16 มค 61           | 31 ธค 60                     | 21 ธค 60                   |                                    | 21 ธค 60             |  |  |              |
| 14    | เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหลุม ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง                    | 920,000.00   | 918,000.00              | 2,000.00               | 15/2561     | 17 พย 60 | 16 มค 61           | 31 ธค 60                     | 7 ธค 60                    |                                    | 15 ธค 60             |  |  |              |
| 15    | เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหลุม ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง                                                       | 38,000.00    | 38,000.00               | -                      | 17/2561     | 17 พย 60 | 16 มค 61           | 31 ธค 60                     | 27 ธค 60                   |                                    | 27 ธค 60             |  |  |              |
| 16    | เครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์(Doptone) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหลุม ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง                                        | 75,000.00    | 45,000.00               | 30,000.00              | 23/2561     | 17 พย 60 | 16 มค 61           | 31 ธค 60                     | 20 ธค 60                   |                                    | 20 ธค 60             |  |  |              |
| 17    | เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหลุม ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง                                       | 70,000.00    | 66,000.00               | 4,000.00               | 24/2561     | 17 พย 60 | 16 มค 61           | 31 ธค 60                     | 22 ธค 60                   |                                    | 22 ธค 60             |  |  |              |



| ลำดับ | รายการ                                                                                                                                  | วงเงินจัดสรร | การบริหารสัญญา          |                        |             |          |                    |                              | การส่งมอบและเบิกจ่าย       |                                   |                      |  |  | ปัญหาอุปสรรค |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------|-------------|----------|--------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|--|--------------|
|       |                                                                                                                                         |              | วงเงินตามสัญญา<br>(บาท) | เงินเหลือจ่าย<br>(บาท) | สัญญาเลขที่ | ลงวันที่ | ครบกำหนด<br>ส่งมอบ | การบอกเรียก<br>ค่าปรับ (วคป) | การส่งมอบ/<br>ตรวจรับ(วคป) | การสงวนสิทธิ์<br>ปรับ(ถ้ามี)(วคป) | การเบิกจ่าย<br>(วคป) |  |  |              |
| 18    | เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหลุม ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง                         | 375,000.00   | 300,000.00              | 75,000.00              | 18/2561     | 17 พย 60 | 16 มค 61           | 31 ธค 60                     | 27 ธค 60                   |                                   | 27 ธค 60             |  |  |              |
| 19    | หม้อแช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหลุม ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 1 หม้อ                                        | 54,000.00    | 53,000.00               | 1,000.00               | 20/2561     | 17 พย 60 | 16 มค 61           | 31 ธค 60                     | 27ธค 60                    |                                   | 27ธค 60              |  |  |              |
| 20    | หม้อต้มสมุนไพร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหลุม ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 1 <sup>หม้อ</sup>                             | 97,000.00    | 95,000.00               | 2,000.00               | 21/2561     | 17 พย 60 | 16 มค 61           | 31 ธค 60                     | 27ธค 60                    |                                   | 27ธค 60              |  |  |              |
| 21    | เครื่องวัดความดันแบบดิจิทัล โรงพยาบาลสากเหล็ก ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 30 เครื่อง                                       | 75,000.00    | 38,700.00               | 36,300.00              | 25/2561     | 17 พย 60 | 16 มค 61           | 31 ธค 60                     | 29 ธค 60                   |                                   | 29 ธค 60             |  |  |              |
| 22    | เครื่องวัดความดันแบบดิจิทัล โรงพยาบาลสามง่าม ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 30 เครื่อง                                          | 75,000.00    | 38,700.00               | 36,300.00              | 25/2561     | 17 พย 60 | 16 มค 61           | 31 ธค 60                     | 29 ธค 60                   |                                   | 29 ธค 60             |  |  |              |
| 23    | เครื่องวัดความดันแบบดิจิทัล โรงพยาบาลดงเจริญ ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 30 เครื่อง                                      | 75,000.00    | 38,700.00               | 36,300.00              | 25/2561     | 17 พย 60 | 16 มค 61           | 31 ธค 60                     | 29 ธค 60                   |                                   | 29 ธค 60             |  |  |              |
| 24    | เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโสน ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง                   | 86,000.00    | 85,000.00               | 1,000.00               | 19/2561     | 17 พย 60 | 16 มค 61           | 31 ธค 60                     | 27 ธค 60                   |                                   | 27 ธค 60             |  |  |              |
| 25    | เครื่องตั้งคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโสน ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 4 เครื่อง | 1,500,000.00 | 1,492,000.00            | 8,000.00               | 22/2561     | 17 พย 60 | 16 มค 61           | 31 ธค 60                     | 27 ธค 60                   |                                   | 27 ธค 60             |  |  |              |
| 26    | เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโสน ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง                        | 38,000.00    | 38,000.00               | -                      | 17/2561     | 17 พย 60 | 16 มค 61           | 31 ธค 60                     | 27 ธค 60                   |                                   | 27 ธค 60             |  |  |              |
| 27    | เครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์(Doptone) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโสน ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง         | 75,000.00    | 45,000.00               | 30,000.00              | 23/2561     | 17 พย 60 | 16 มค 61           | 31 ธค 60                     | 20 ธค 60                   |                                   | 20 ธค 60             |  |  |              |



| ลำดับ | รายการ                                                                                                                         | วงเงินจัดสรร | การบริหารสัญญา          |                        |             |          |                    |                              | การส่งมอบและเบิกจ่าย       |                                   |                      |  |  | ปัญหาอุปสรรค |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------|-------------|----------|--------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|--|--------------|
|       |                                                                                                                                |              | วงเงินตามสัญญา<br>(บาท) | เงินเหลือจ่าย<br>(บาท) | สัญญาเลขที่ | ลงวันที่ | ครบกำหนด<br>ส่งมอบ | การบอกเรียก<br>ค่าปรับ (วคป) | การส่งมอบ/<br>ตรวจรับ(วคป) | การลงนามสิทธิ<br>ปรับ(ถ้ามี)(วคป) | การเบิกจ่าย<br>(วคป) |  |  |              |
| 28    | เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลหนองโสน ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัด<br>พิจิตร 1 เครื่อง         | 375,000.00   | 300,000.00              | 75,000.00              | 18/2561     | 17 พย 60 | 16 มค 61           | 31 ธค 60                     | 27 ธค 60                   |                                   | 27 ธค 60             |  |  |              |
| 29    | หม้อแช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนอง<br>โสน ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 1 หม้อ                            | 54,000.00    | 53,000.00               | 1,000.00               | 20/2561     | 17 พย 60 | 16 มค 61           | 31 ธค 60                     | 27 ธค 60                   |                                   | 27 ธค 60             |  |  |              |
| 30    | หม้อต้มแผ่นความร้อน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล<br>หนองโสน ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 1<br>หม้อ                    | 97,000.00    | 95,000.00               | 2,000.00               | 21/2561     | 17 พย 60 | 16 มค 61           | 31 ธค 60                     | 27 ธค 60                   |                                   | 27 ธค 60             |  |  |              |
| 31    | ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) โรงพยาบาล<br>สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน<br>อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร               | 428,000.00   | 428,000.00              | 0                      | 84/2561     | 29 ธค 60 | 27 กพ 61           | 15 กพ 61                     | 23 กพ 61                   |                                   | 19 มีค 61            |  |  |              |
| 32    | ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) โรงพยาบาล<br>ห้วยค้อ ตำบลเขาทราย อำเภอห้วยค้อ จังหวัด<br>พิจิตร                                | 428,000.00   | 428,000.00              | 0                      | 84/2561     | 29 ธค 60 | 27 กพ 61           | 15 กพ 61                     | 23 กพ 61                   |                                   | 19 มีค 61            |  |  |              |
| 33    | ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบางไผ่ บ้านห้วยคด ตำบลบางมูลนาก<br>อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร | 428,000.00   | 428,000.00              | 0                      | 84/2561     | 29 ธค 60 | 27 กพ 61           | 15 กพ 61                     | 23 กพ 61                   |                                   | 19 มีค 61            |  |  |              |
| 34    | ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบ้านแหลมวัง ตำบลบึงนาราง อำเภอเมือง<br>ราช จังหวัดพิจิตร        | 428,000.00   | 428,000.00              | 0                      | 84/2561     | 29 ธค 60 | 27 กพ 61           | 15 กพ 61                     | 23 กพ 61                   |                                   | 19 มีค 61            |  |  |              |
| 35    | ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) โรงพยาบาลโพทะเล<br>ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร                                        | 428,000.00   | 428,000.00              | 0                      | 84/2561     | 29 ธค 60 | 27 กพ 61           | 15 กพ 61                     | 23 กพ 61                   |                                   | 19 มีค 61            |  |  |              |
| 36    | ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) โรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบลบางคลาน ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล<br>จังหวัดพิจิตร                | 428,000.00   | 428,000.00              | 0                      | 84/2561     | 29 ธค 60 | 27 กพ 61           | 15 กพ 61                     | 23 กพ 61                   |                                   | 19 มีค 61            |  |  |              |



| ลำดับ | รายการ                                                                                                                    | วงเงินจัดสรร  | การบริหารสัญญา          |                        |             |          |                    |                              | การส่งมอบและเบิกจ่าย       |                                     |                      |  |  | ปัญหาอุปสรรค |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|------------------------|-------------|----------|--------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------|--|--|--------------|
|       |                                                                                                                           |               | วงเงินตามสัญญา<br>(บาท) | เงินเหลือจ่าย<br>(บาท) | สัญญาเลขที่ | ลงวันที่ | ครบกำหนด<br>ส่งมอบ | การบอกเรียก<br>ค่าปรับ (วตป) | การส่งมอบ/<br>ตรวจรับ(วตป) | การส่งงานสิทธิ์<br>ปรับ(ถ้ามี)(วตป) | การเบิกจ่าย<br>(วตป) |  |  |              |
| 37    | ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสื่อเหลือง ตำบลเสื่อเหลือง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร | 428,000.00    | 428,000.00              | 0                      | 84/2561     | 29 ธค 60 | 27 กพ 61           | 15 กพ 61                     | 23 กพ 61                   |                                     | 19 มีค 61            |  |  |              |
| 38    | ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเนินสว่าง ตำบลเนินสว่าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร | 428,000.00    | 428,000.00              | 0                      | 84/2561     | 29 ธค 60 | 27 กพ 61           | 15 กพ 61                     | 23 กพ 61                   |                                     | 19 มีค 61            |  |  |              |
| 39    | ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองคู ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร          | 428,000.00    | 428,000.00              | 0                      | 84/2561     | 29 ธค 60 | 27 กพ 61           | 15 กพ 61                     | 23 กพ 61                   |                                     | 19 มีค 61            |  |  |              |
| 40    | ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเก่า ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร         | 428,000.00    | 428,000.00              | 0                      | 84/2561     | 29 ธค 60 | 27 กพ 61           | 15 กพ 61                     | 23 กพ 61                   |                                     | 19 มีค 61            |  |  |              |
| 41    | ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางสามต้น ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร        | 428,000.00    | 428,000.00              | 0                      | 84/2561     | 29 ธค 60 | 27 กพ 61           | 15 กพ 61                     | 23 กพ 61                   |                                     | 19 มีค 61            |  |  |              |
| 42    | ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) โรงพยาบาลสามง่าม ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร                                   | 428,000.00    | 428,000.00              | 0                      | 84/2561     | 29 ธค 60 | 27 กพ 61           | 15 กพ 61                     | 23 กพ 61                   |                                     | 19 มีค 61            |  |  |              |
| 43    | ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาบกระเปา ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร           | 428,000.00    | 428,000.00              | 0                      | 84/2561     | 29 ธค 60 | 27 กพ 61           | 15 กพ 61                     | 23 กพ 61                   |                                     | 19 มีค 61            |  |  |              |
| รวม   |                                                                                                                           | 22,954,000.00 | 19,554,500.00           | 3,399,500.00           |             |          |                    |                              |                            |                                     |                      |  |  |              |
